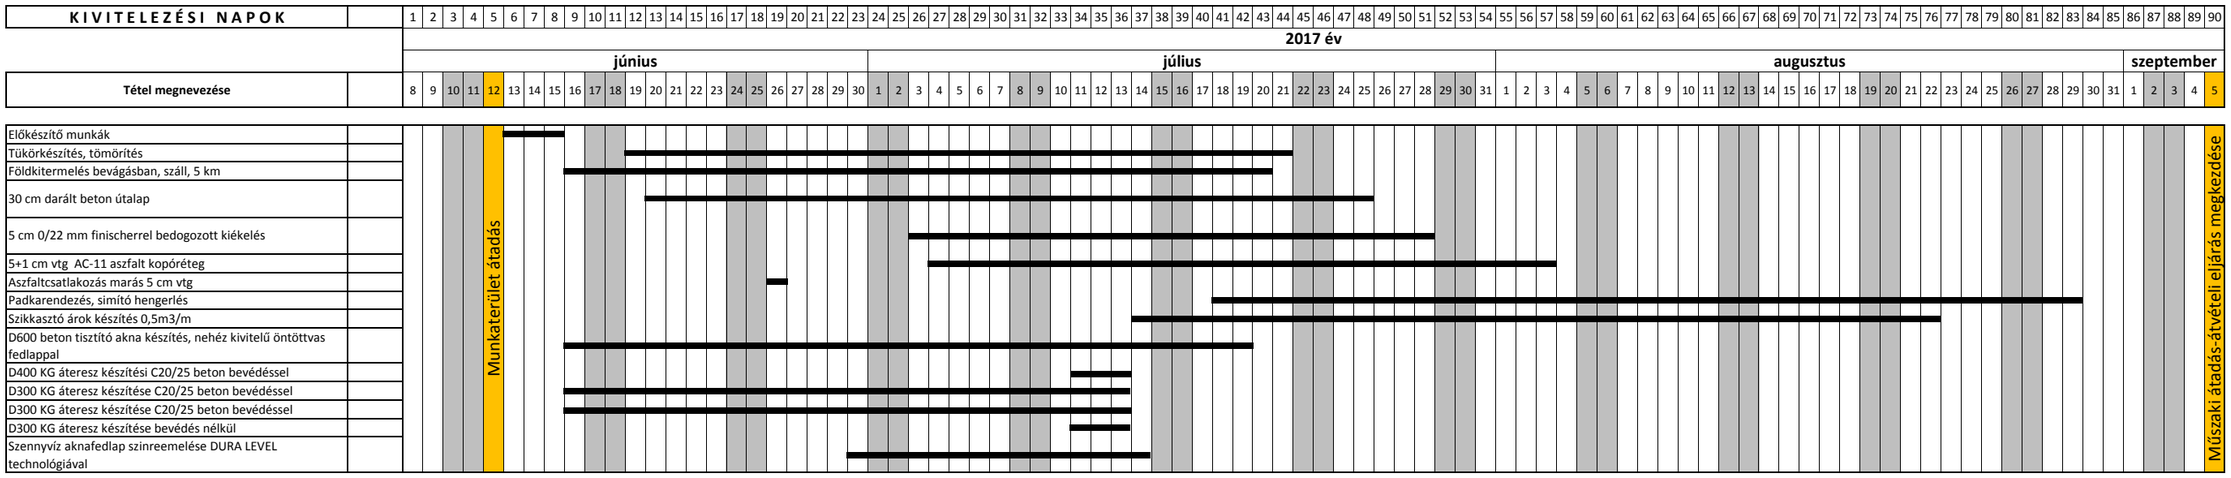
KIVITELEZÉSI NAPOK
2017 év
június
július
augusztus
szeptember
Tétel megnevezése
Munkaterület átadás
Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése
Előkészítő munkák
Tükörkészítés, tömörítés
Földkitermelés bevágásban, száll, 5 km
30 cm darált beton útalap
5 cm 0/22 mm finischerrel bedogozott kiékelés
5+1 cm vtg AC-11 aszfalt kopóréteg
Aszfaltcsatlakozás marás 5 cm vtg
Padkarendezés, simító hengerlés
Szikkasztó árok készítés 0,5m3/m
D600 beton tisztító akna készítés, nehéz kivitelű öntöttvas fedlappal
D400 KG áteresz készítési C20/25 beton bevédéssel
D300 KG áteresz készítése C20/25 beton bevédéssel
D300 KG áteresz készítése C20/25 beton bevédéssel
D300 KG áteresz készítése bevédés nélkül
Szennyvíz aknafedlap szinreemelése DURA LEVEL technológiával
